




Logius
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Migratie LVBB Productie


26 maart 2024




Migratie LVBB naar SP/ODCN





Acceptatie
Preprod
Productie

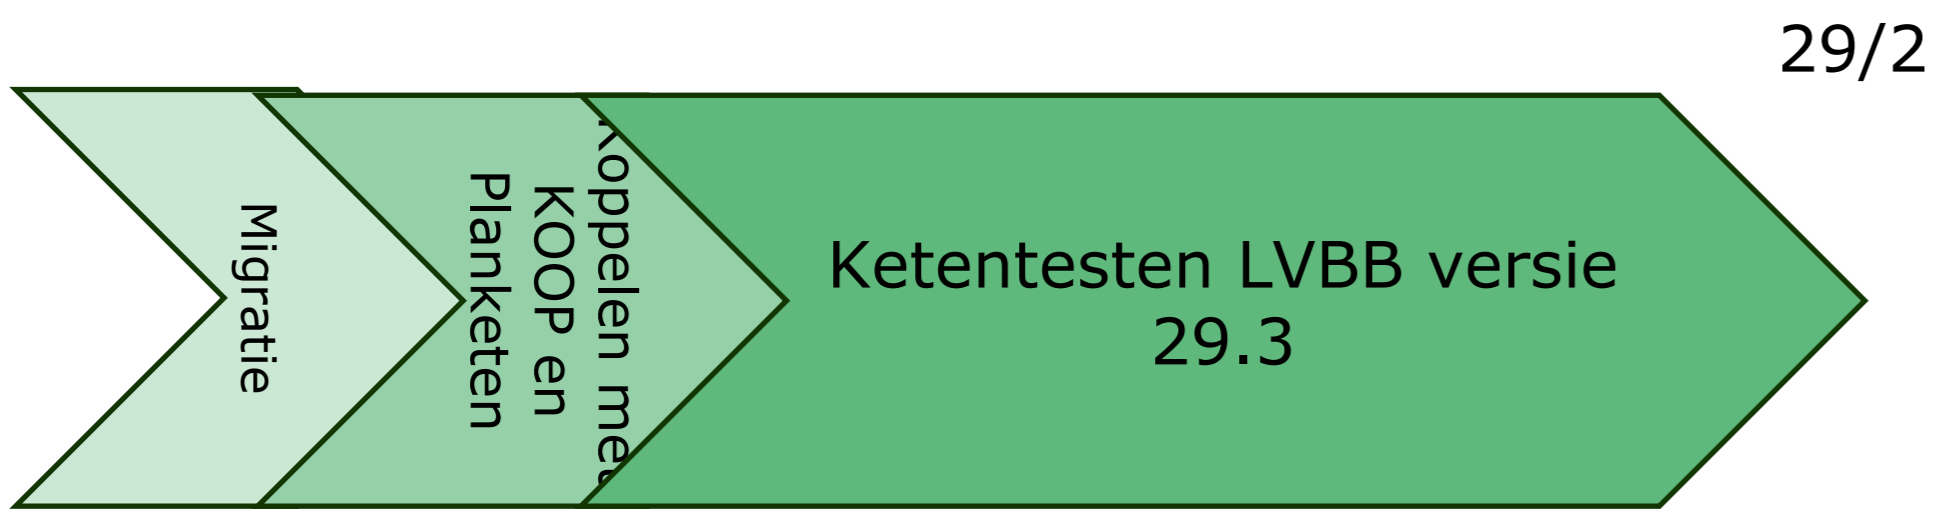

14/15



28/29





Migratie Preproductie

- Testen 29.5 (ipv 29.3)
 - 5 opgeloste bugs & nieuwe stories 100% akkoord
 - Regressietest zijn gestart maar niet volledig afgerond (niet haalbaar in één dag)
- Twee geconstateerde niet blokkerende issues:
 - Het hergebruiken van dezelfde GML-ID geeft nu een foutmelding
 - Het niet (meer) toevoegen van de ondertekenstap geeft een foutmelding, de validatie hierop is verwijderd
- Lessons learned:
 - Technische test van de applicatie vooraf obv stubs
 - Uitrollen laatste versie vóór de start van de migratie



Gebruik Preproductie sinds 18 maart

Preproductie	Totaal	18-mrt	19-mrt	20-mrt	21-mrt	22-mrt	25-mrt
Publicatie	26	0	6	7	7	4	2
valide	39	6	3	3	6	11	10
Niet valide	96	11	11	19	6	27	22
Afgebroken/mislukt	53	16	15	11	8	1	2
Totaal	214	33	35	40	27	43	36

- *Issue met GML-ID leidde tot 30-50% afbreken opdracht*
- *Dit is op 20 maart einde dag hersteld*
- *Aantal is aanzienlijk verminderd*

- *Sinds 22 maart is het gebruikt weer "normaal"*
- *Niet-valide ligt boven 50%. Dit is een "normaal" gemiddelde*

Preproductie	Totaal	18-mrt	19-mrt	20-mrt	21-mrt	22-mrt	25-mrt
Publicatie	12%	0%	17%	18%	26%	9%	6%
valide	18%	18%	9%	8%	22%	26%	28%
Niet valide	45%	33%	31%	48%	22%	63%	61%
Afgebroken/mislukt	25%	48%	43%	28%	30%	2%	6%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Mijlpalen Productie

Onderwerp	Productie
Functioneel en ketentesten 29.5.2	Afgerond en uitgerold
Testen stabiliteit	Onderhanden
Definitieve GO voor start	27 maart 15:00
BHKV gesloten	Woensdag 27/3 vanaf 17:00
Migratie data	28/3
Omgeving koppelen en testen	29/3
Testen met 2 plansoftware leverancier	29/3
Go besluit	29/3 [15:00]
Ervaren functionaliteit en stabiliteit	Vanaf 2/4



Gebruikers impact

Onderwerp	Productie
Geen validatie/publicaties	28/3 en 29/3
Niet beschikbare bekendmakingsdata	28/3 en 29/3
Beschikbare IWT data	Niet van toepassing
Go besluit	29/3



Communicatie

- Melding op Informatiepunt Leefomgeving (Onderhoud)
- Releasenote voor leveranciers met overzicht van de wijzigingen en opgeloste bugs is opgeleverd
- Go No Go momenten in afstemming met TBO
- Communicatie met eindgebruikers (bevoegde gezagen) via nieuwsbrief ASD en de koepels

13
mrt

LVBB 14 en 15 maart 2024 niet beschikbaar op de pre-productieomgeving (oefenomgeving, PRE/ETO)

Vanaf woensdag 13 maart 17:00 uur tot en met vrijdag 15 maart 17:00 uur is de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) niet beschikbaar op de pre-productieomgeving (oefenomgeving, PRE/ETO). Het gaat om een grote release (release 29.3) waarbij ook infrastructurele aanpassingen worden gedaan. Vandaar dat een langere doorlooptijd noodzakelijk is. Lees meer...

13 maart 2024

In maart 2024 aantal dagen geen omgevingsdocumenten publiceren via LVBB

Deze maand migreert de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) naar een nieuw technisch platform. Dit betekent dat overheden een aantal dagen geen omgevingsdocumenten kunnen publiceren. Dit geldt voor de productieomgeving en de pre-productieomgeving (oefenomgeving). Het Omgevingsstoket blijft beschikbaar.

Voor wie belangrijk?

Werkt u bij een gemeente, waterschap, provincie of het Rijk en publiceert u (ontwerp-)omgevingsdocumenten? Of ondersteunt u overheden hierbij, bijvoorbeeld als plansoftwareleverancier? Dan is onderstaande informatie belangrijk voor u. Het is verstandig om uw medewerkers tijdig te informeren over het onderstaande.

Data pre-productieomgeving

De pre-productieomgeving van de LVBB is niet beschikbaar vanaf woensdag 13 maart om 17.00 uur tot en met vrijdag 15 maart om 17.00 uur.

Dat betekent het volgende:

- U kunt geen nieuwe omgevingsdocumenten publiceren.
- U kunt geen omgevingsdocumenten valideren.
- U kunt geen besluiten publiceren met een bekendmakingsdatum in deze periode.
- U zult merken dat u in deze periode een foutmelding krijgt indien u een van bovenstaande acties wil uitvoeren. Hoe die foutmelding eruitziet is afhankelijk van de instellingen door de softwareleverancier

U kunt wel besluiten publiceren die in werking treden in deze periode.

Data productieomgeving

De productieomgeving van de LVBB is niet beschikbaar vanaf woensdag 27 maart om 17.00 uur tot en met vrijdag 29 maart om 17.00 uur.

Voor de productieomgeving gelden in deze periode dezelfde bovenstaande voorwaarden als voor de productieomgeving. Vanaf de eerste werkdag hierna (2 april) kunt u bovenstaande acties weer uitvoeren in de productieomgeving.

Let op

Houd in de planning van uw eventuele publicatie of validatie rekening met deze data. Plan uw publicatie of validatie dus vóór of na de migratie LVBB.

Heeft u een spoedeisend besluit? Neem dan direct contact op met KOOP via IPLO



Advies leveranciers?





Resultaten op productie

	Omgevingsplan	Waterschaps- verordening	Omgevings- verordening	Project- besluit VTD	Projectbesluit 1 TRD	Projectbesluit > 1 TRD	Omgevings- visie	Voorbereidings- besluit			Ontwerp- besluit				Reactieve Interventie	Instructie	Programma			Natura 2000	Totaal
	G	W	P	RPW	RPW	RPW	RPG	R	P	G	R	P	G	W	P	RP	R	P	G	RP	
Januari	26	6	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	3	0	0	2	1	0	0	48
Februari	25	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6	1	0	0	0	0	1	0	44
Totaal	51	9	8	1	0	0	0	0	2	0	17				0	0	2	1	1	0	92
